


Разбивочный план

Ведомость зданий и сооружений

№	Наименование	Примечание
1	Проектируемое здание	
2	Кантора	
3	Гардеробная	
4	Мобильная душевая кабина с электронагревателем	
5	Помещение для приема пищи	
6	Охрана	
7	Бункеры для металлолома и строительных отходов	
8	Складское помещение	
9	Биотуалеты	

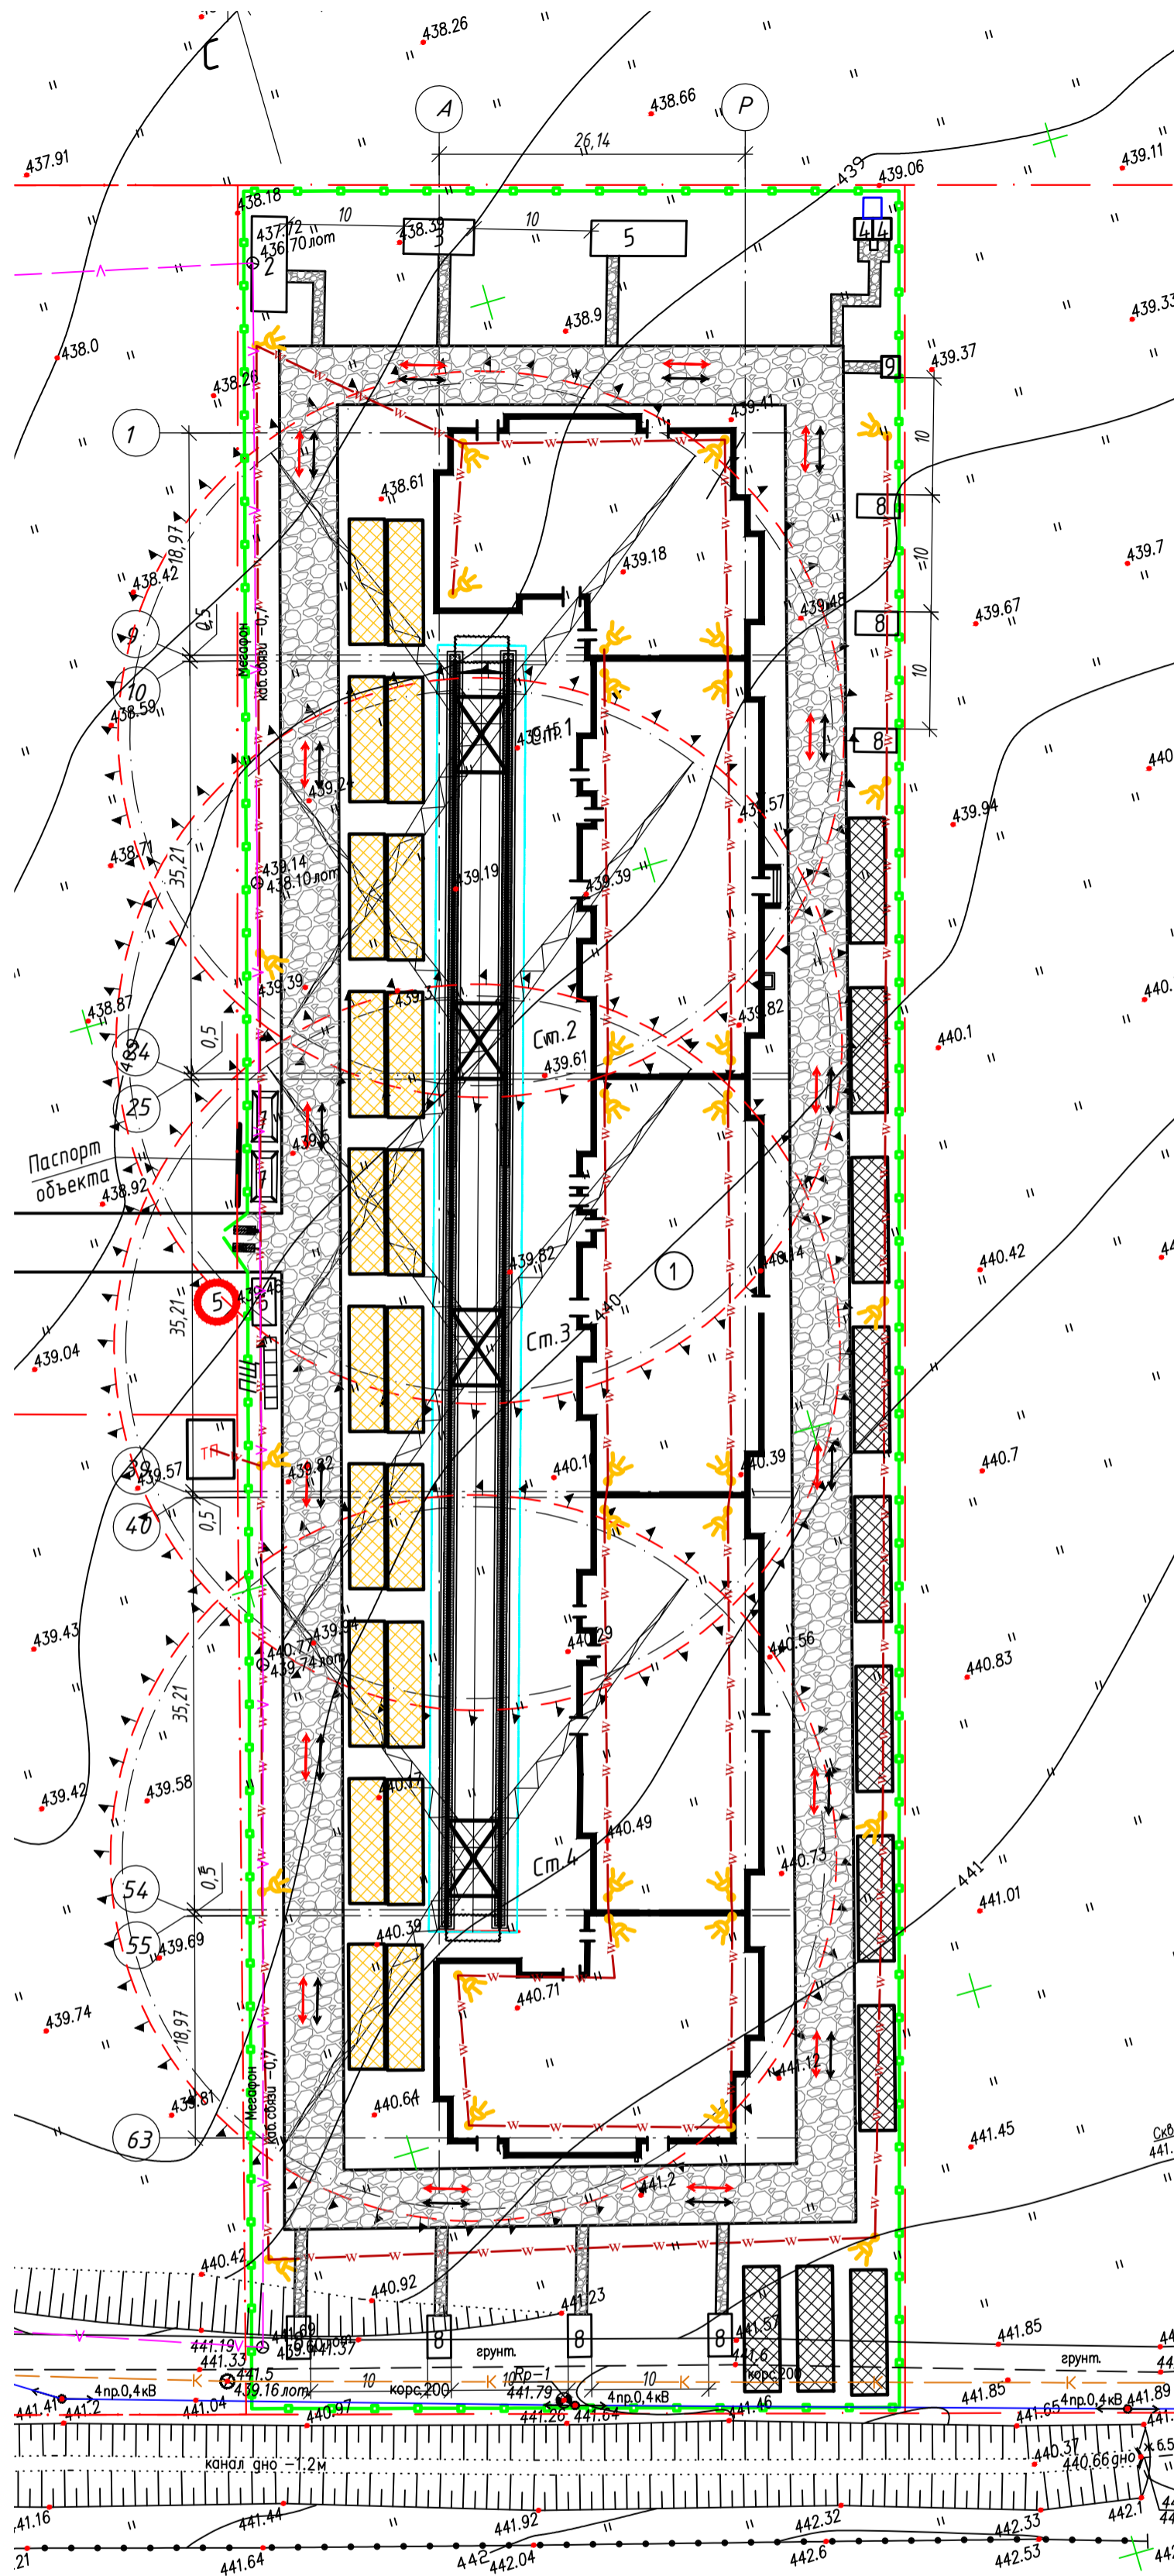

Примечание: Стойгенплан разработан на подготовительные и строительно-монтажные работы. В подготовительный период необходимо выполнить комплекс внутриплощадочных и внеплощадочных работ. Внеплощадочные подготовительные работы включают в себя строительство подъездных путей, инженерных сетей временного электро и водоснабжения, сетей канализации, устройство связи для управления строительством.

Внутриплощадочные работы предусматривают сдачу - приемку геодезической разбивочной основы строительства и геодезические работы для прокладки временных инженерных сетей, вертикальную планировку стройплощадки, устройство временных дорог, инвентарных временных ограждений стройплощадки, размещение временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство складских площадок для материалов, конструкций и оборудования, обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

При въезде на строительную площадку установить схему движения автотранспорта на территории строительства. При въезде на строительную площадку установить мойку для автотранспорта.

Радиусы закругления временных автодорог - 9/12 покрытие дорог выполнять из бетонных дорожных плит.

Обеспечение строительства водой, электроэнергией, канализацией производится от существующих сетей.


Устройство временного ограждения выполнить по границе благоустройства.

Строительный объект должен быть обеспечен счетчиками учета электроэнергии и воды. При выполнении работ на стройплощадке необходимо руководствоваться СНиП III-4-80*, СНиП 12-03-99, требований ССБТ ГОСТ 12.3.009-76*, ГОСТ 12.04.004-79, ГОСТ 12.1.004-91*, ГОСТ 12.3.033.


На площадках открытого складирования хранение горячих строительных материалов, изделий и конструкций из горячих материалов не предусмотрено.

Во временных помещениях строительной площадки предусмотреть устройство системы автоматической пожарной сигнализации. Технические решения определить в ППР.


Временная дорога

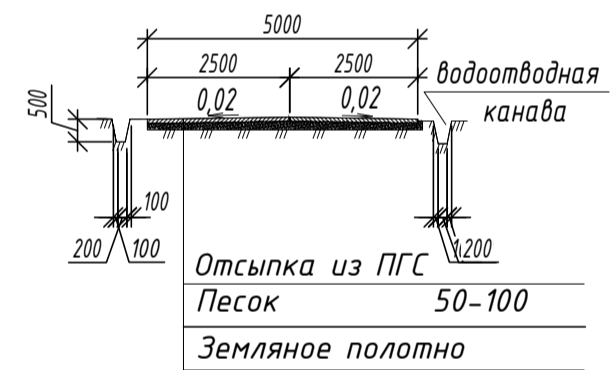

Ограждение строительной площадки без козырька

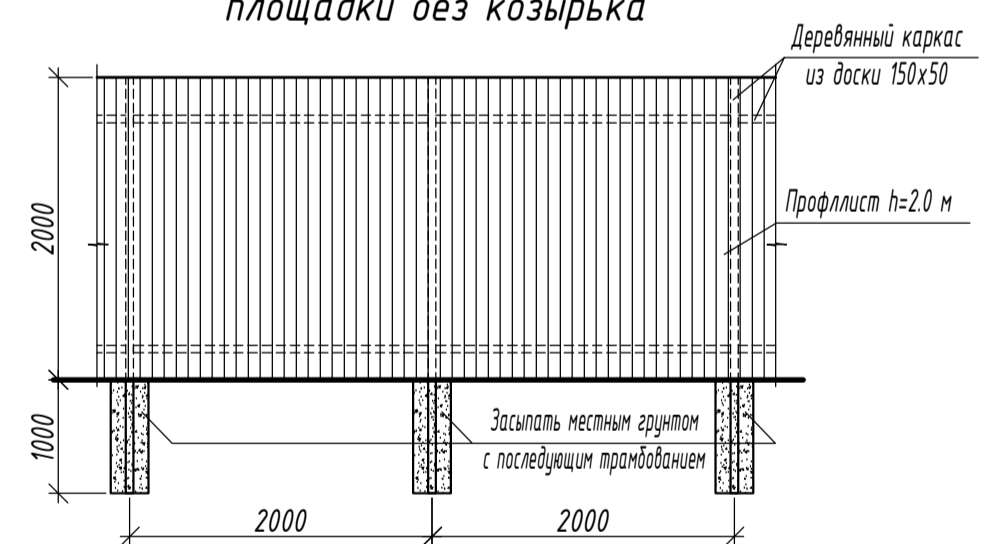

Ворота

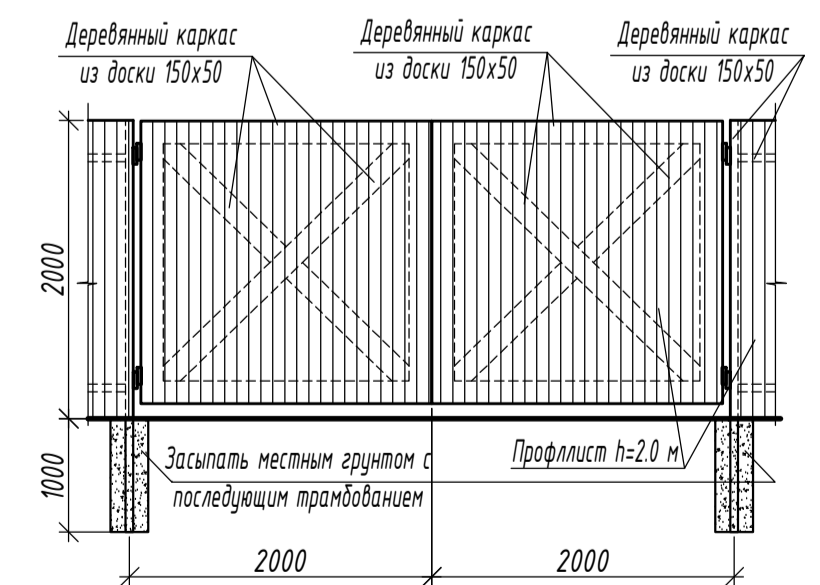

Условные обозначения

- Линия границы зоны действия крана
- Линия границы опасной зоны крана
- Временная ЛЭП
- Проектор охранного освещения
- Знак ограничения скорости
- Граница участка
- Временное ограждение
- Направление движения транспортных средств
- Направление движения транспортных средств пожаротушения
- Площадка открытого складирования
- ПЩ - Пожарный щит
- Въезд
- Выезд
- Мойка для колес автотранспорта
- Площадка складирования материалов подготовленных к монтажу

				303-2022-ПОС.6.Г.Ч					
				"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в п. Капельница г. Железнодорожка"					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3 очередь	Стдия	Лист	Листов
Исполнил		Ерошкин			09.06.22				
ГИП		Ворожьев			09.06.22		П	2	
Н.контр		Ворожьева			09.06.22	Стройгенплан	ООО "РЕАЛПРОЕКТ" г. Ставрополь		

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №
